

2024年上半年信息系统项目管理师论文写作参考答案 (5月26日第2批)



淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

本试卷满分 75 分，论文篇幅要求不少于 2000 字，正文 2500 字以下，项目真实，逻辑清晰，条理清楚，论述得当。

项目成本管理是为了项目在批准的预算内完成，而对成本进行规划、估算、预算、管理和控制的过程。请以“论信息系统项目的成本管理”为题论题：

- 1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。（选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）
- 2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目成本管理的认识：
 - （1）根据你所描述的项目，写出项目成本基准形成过程
 - （2）根据你所描述的项目，画出项目的 S 曲线图。
 - （3）结合你描述的项目，根据成本控制的目标，写出项目进展过程中你是如何进行成本控制的？

【野人老师点评】

建议的写作思路：

【只有一个题目，字数要求 2000-2500 字，不需要写摘要，最多画 3 个图】

背景 500 字

过渡段 200 字左右，可简单介绍下 3 个子题目主要内容，然后在相应过程里面重点介绍


一、规划成本管理【简单写写就可以】

二、成本估算【简单写写就可以】

三、成本预算【多写一些文字建议 300-500 字，需要写成本基准的形成过程以及画 S 型曲线，成本基准如果能画一个表格更好，就是按照时间花钱的表格，当然这个表格不是必须的，画上更好，没花也不影响通过】

阶段	历时	工作内容	数量	资金预算
阶段一	1 个月	需求调研和分析	3 人/月	39000
		系统架构与数据库设计	8 人/月	106000
		设备采购		160500
阶段二	4 个月	辅助审批子系统开发	8 人/月	109000
		问题管理子系统开发	11 人/月	143000
		风险评估预警子系统开发与设计	9 人/月	119600
		全市房地产基础数据整理与入库	8 人/月	105000

				
阶段三	3 个月	系统集成、测试与上线	4 人/月	52000
阶段四	1 个月	项目收尾	2 人/月	28000

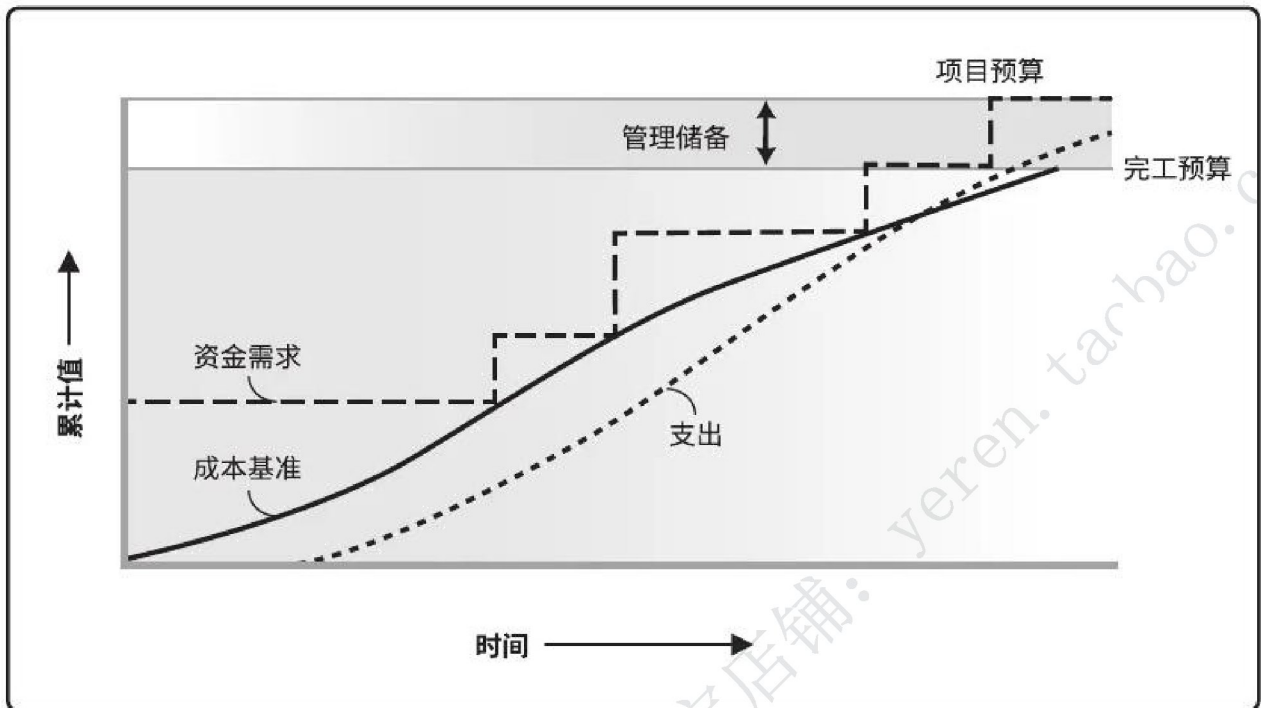

【野人老师点评：S 型曲线能画出横坐标和纵坐标，横坐标是表示时间，纵坐标是表示成本，之后 S 曲线从 0 开始，结束 PV 之后等于 BAC 完工预算，基本就可以，线是曲线就行】

四、成本控制【重点写 300-500 字，需要写成本控制的目标和成本控制的措施】

结尾【300 字】
